

Relatório de Obras

2º Trimestre 2016

Contatos
Fundos Imobiliários
 Tel. (11) 3509-6600
 middleoffice.fii@riobravo.com.br

Ouvidoria
 Tel. 0800 722 9910
 ouvidoria@riobravo.com.br

Comentários do Gestor

No 2º Trimestre de 2016 o Fundo realizou R\$ 308 mil em pagamentos para Expansão do projeto Lubrax II, o que representa 0,10% do valor total a ser investido no projeto. Até o fechamento do 2º trimestre a evolução da Obra chegou em 70,2% do valor total.

Dados do Empreendimento

Descrição: Expansão e modernização da Fábrica de Lubrificantes - Projeto Lubrax II
Participação do Fundo: 100%


Dados

Localização da Obra: Duque de Caxias - RJ
Construtora: Tecservice, Mecalux, Servmar e Gemprom Engenharia
Gerenciadora da Obra: BR Distribuidora
Data do Início da Obra: 2011
Entrega Prevista: Julho 2016

Cronograma Andamento da obra

Valor total a ser investido: R\$ 317.000.000
Investimento no Trimestre: R\$ 307.960
Investimento Acumulado: R\$ 222.567.296
Evolução Acumulada: 70,2%

Evolução Física da Obra

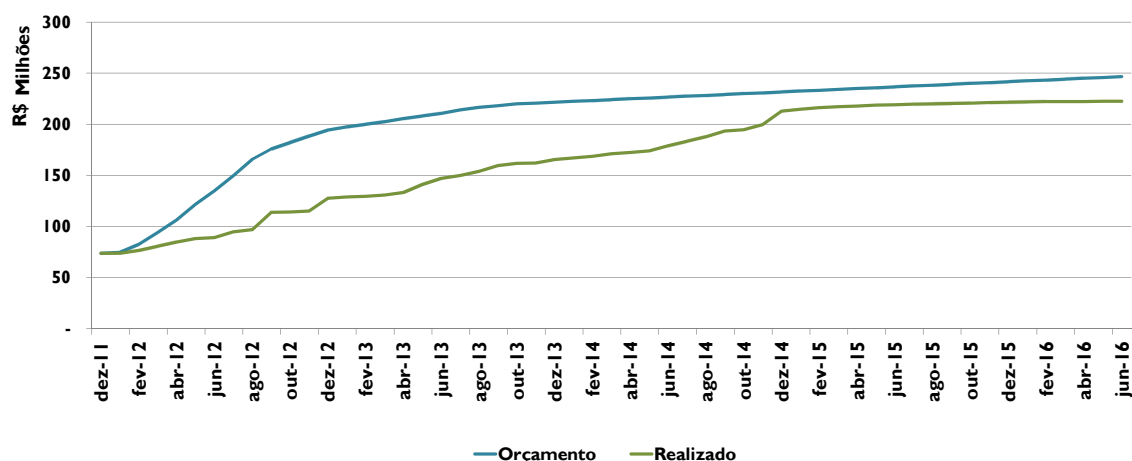

Registro Fotográfico



Disclaimer

Todo o material aqui contido, incluindo os textos, gráficos, imagens e qualquer outro material de comunicação audiovisual são de propriedade única e exclusiva da Rio Bravo, bem como quaisquer informações, relatórios, produtos e serviços, que conjuntamente compõem valiosa propriedade intelectual da Rio Bravo. O material aqui veiculado deve ser entendido como de uso pessoal. Não é permitido qualquer tipo de transmissão, cópia ou adulteração sem o expresse e escrito consentimento da Rio Bravo, sob pena de se tratar clara infração aos direitos de propriedade da Rio Bravo, acarretando as devidas sanções legais. As informações aqui contempladas não constituem qualquer tipo de oferta ou recomendação de investimento. A Rio Bravo não é responsável por qualquer utilização não autorizada do material e das informações aqui dispostas.
